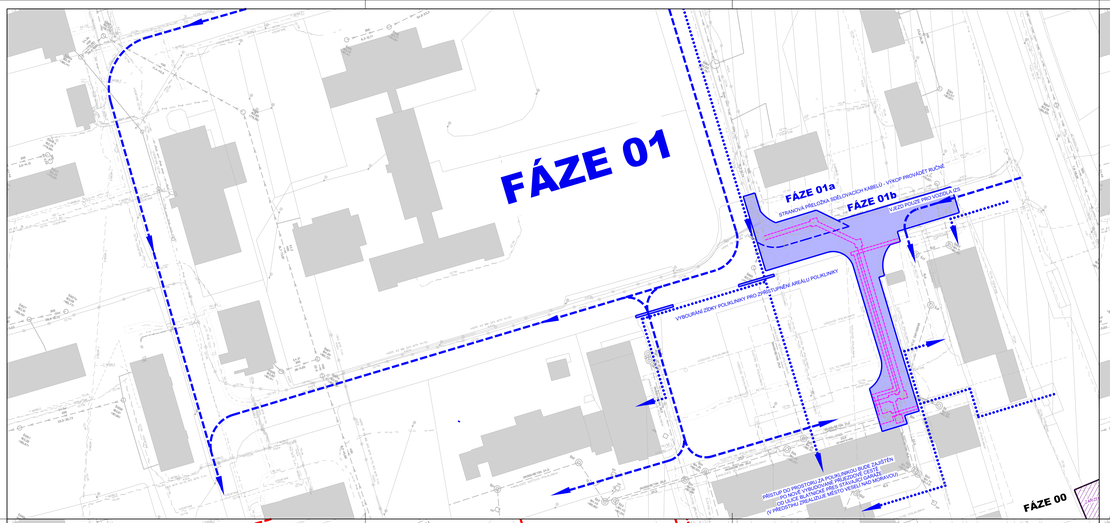


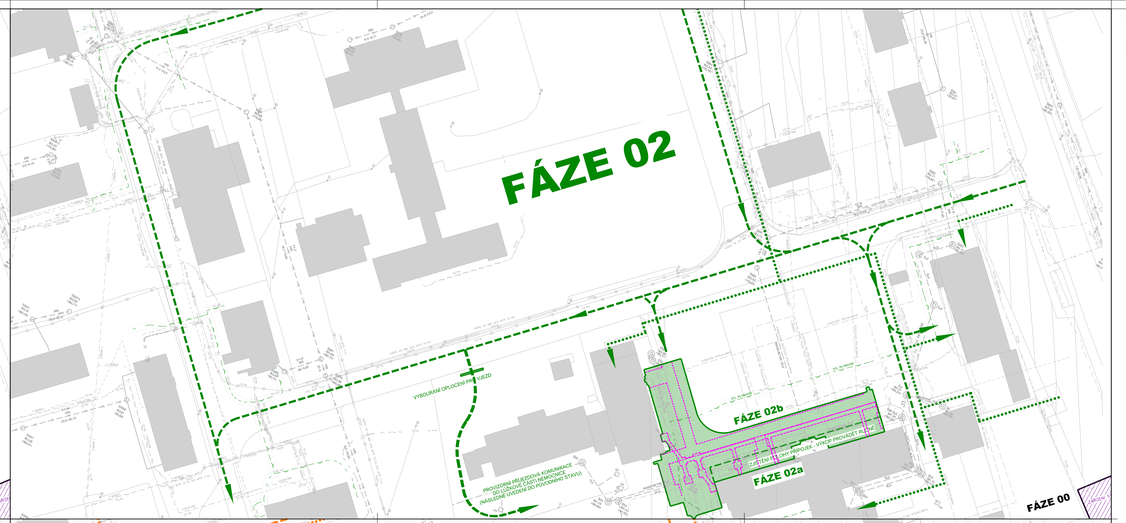


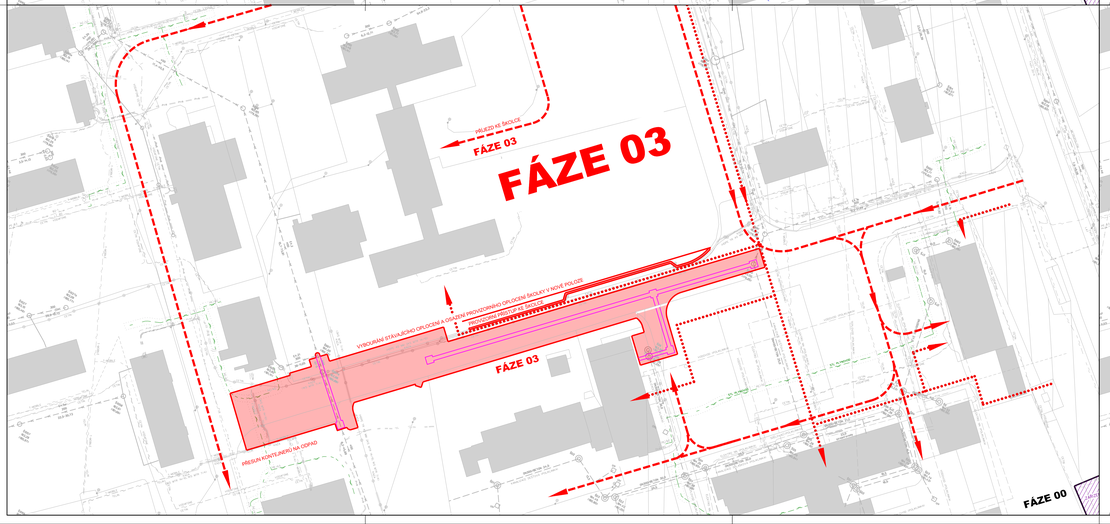


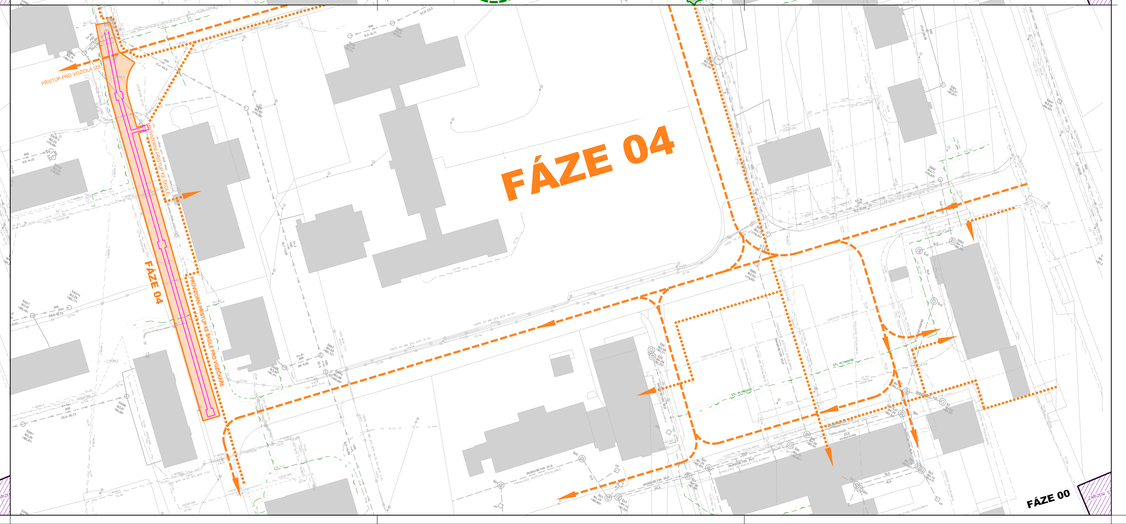


LEGENDA :

HRANICE PARCEL KN

ORGANIZACE DOPRAVY:

- FÁZE 01 MOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 02 MOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 03 MOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 04 MOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 01 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 02 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 03 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 04 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
- FÁZE 01 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
- FÁZE 02 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
- FÁZE 03 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
- FÁZE 04 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY

LEGENDA SÍTÍ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ KABELY (VODAFONE)
- SDĚLOVACÍ KABELY (O2 TN)
- SDĚLOVACÍ KABELY (RADIO)
- SDĚLOVACÍ KABELY
- TEPLOVOD
- NOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY METROPLNÍ KABEL TCE.TN
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST (TRPOJNA)
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST NOVÝ RÁM A MŘÍŽ

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

FÁZE 00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
KŘÍŽENÍ VYTÝČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

FÁZE 01 LOKALITA U ZACHRANNÁ - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA
VJEZD DO ZÓNY POVOLEN POUZE VOZIDLŮM IZS
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU PŘED ÚZ, VYBUDOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTĚ OD ULICE BLATNICKÉ
REALIZACE KANALIZACE V VODOVODU PŘED ZZS JMK
(PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI OPTICKÝCH KABELŮ OBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI - KABELY O DO CHRÁNIČŮ)

FÁZE 02 LOKALITA POLIKLINIKA / NEMOCNICE KYJOV - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA
VJEZD K LOŽOVÉ ČÁSTI NEMOCNICE KYJOV ZAJIŠTĚN PO PROVIZORNÍ PAMELOVÉ CESTĚ Z ULICE V POLIKLINIKY)
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU PŘED POLIKLINIKOU
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU PŘED POLIKLINIKOU

FÁZE 03 LOKALITA NEMOCNICE, MATEŘSKÁ ŠKOLKA - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA
(ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY - PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA K OPLOCENÍ V NOVÉ POLOZE)
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU V ULICI V POLIKLINIKY

FÁZE 04 LOKALITA NEMOCNICE, MATEŘSKÁ ŠKOLKA - ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA
(ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DO ŠKOLY - PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA)
ZAŘÍZENÍ POLNÝ PŘÍPOJEK DO BUDOVY PRAKTICKÉ ŠKOLY (KOPAT RUČNĚ)
REALIZACE KANALIZACE A VODOVODU

FÁZE 05 NOVÉ KABELOVÉ SÍTĚ, OCHRANA STÁVAJÍCÍCH
ZKRÁCENÍ, PŘELOŽENÍ A ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
ZACHOVÁNÍ PROVOZU NEZBYTNÉ DOPRAVNÍ OBSLUHY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

FÁZE 06 TĚLESO MÍSTNÍ KOMUNIKACE
(VOZOVKA VČETNĚ CHODNÍKŮ)
ZACHOVÁNÍ PROVOZU NEZBYTNÉ DOPRAVNÍ OBSLUHY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

FÁZE 07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ
VEGETAČNÍ ÚPRAVY
DOKONČOVACÍ PRACE, VEGETAČNÍ ÚPRAVY

NEMOCNICE KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JMK
NEZBYTNÝM PODPRUM STAVEBNÍ SOUVISLÁ S NAVRŽENOU ETAPIZACÍ
A SOUČASNĚ PŘIZPŮSOBENÍ PO VYBRANÉM ZHOTOVITELU STAVBY ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU
PRO VOZIDLA IZS A NEZBYTNÉ DOPRAVNÍ OBSLUHY DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ
PO CELOU DOBU STAVBY V REŽIMU 24/7

KONTAKT NA ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA:

ING. BRONISLAV KLČKA

TEL: 518 601 942
MOBIL: 606 777 692
EMAIL: klacka.bronislav@meritkly.cz

ING. MILAN ŠKARKA, PH.D., MBA
PROVOZNÍ TECHNIKOVY/NÁMĚSTEK

TEL: +420 518 601 961
MOBIL: +420 739 007 925
EMAIL: skarka.milan@meritkly.cz

C

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

| | |
|---|---|
| HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY | ADOS |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ADOLF JEBAVÝ | ING. ADOLF JEBAVÝ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY A DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY, ČKAIT 0008 ADOS BRNO, s.r.o., Kaštanová 33, 62 00 Brno, email: jebav@ados.cz, tel.: +420 604 779 164 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ADOLF JEBAVÝ | ZODPOV. PROJEKTANT: ING. ADOLF JEBAVÝ | VYPRACOVAL: ING. ADOLF JEBAVÝ | KONTROLOVAL: ING. EVA POKORNÁ | AlternativniImprovisStudio ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY A DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY, ČKAIT 0008 ADOS BRNO, s.r.o., Kaštanová 33, 62 00 Brno |
| OBJEDNATEL: MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU | | KRAJ: JIHOMORAVSKÝ | DATUM: 06/2026 | |
| ULIČNÍ PROSTOR | | | FORMÁT: | 16 A4 |
| **KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY** | | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | D.0008BP1 |
| SITUAČNÍ VÝKRESY | | | MĚŘÍTKO: | 23.027 |
| ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | | | ČÍSLO PARE: | M 1:250 |
| | | | | C.4 |
