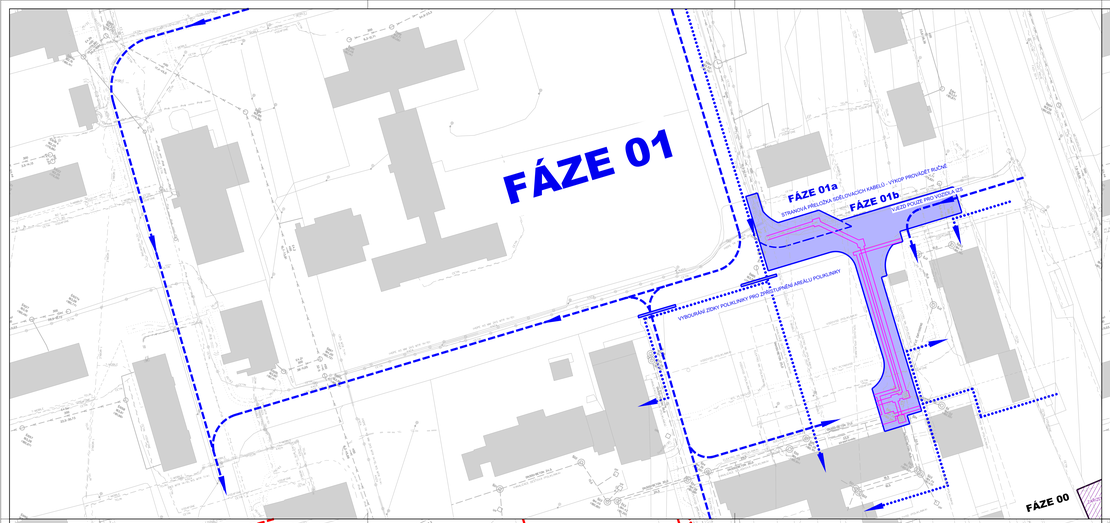

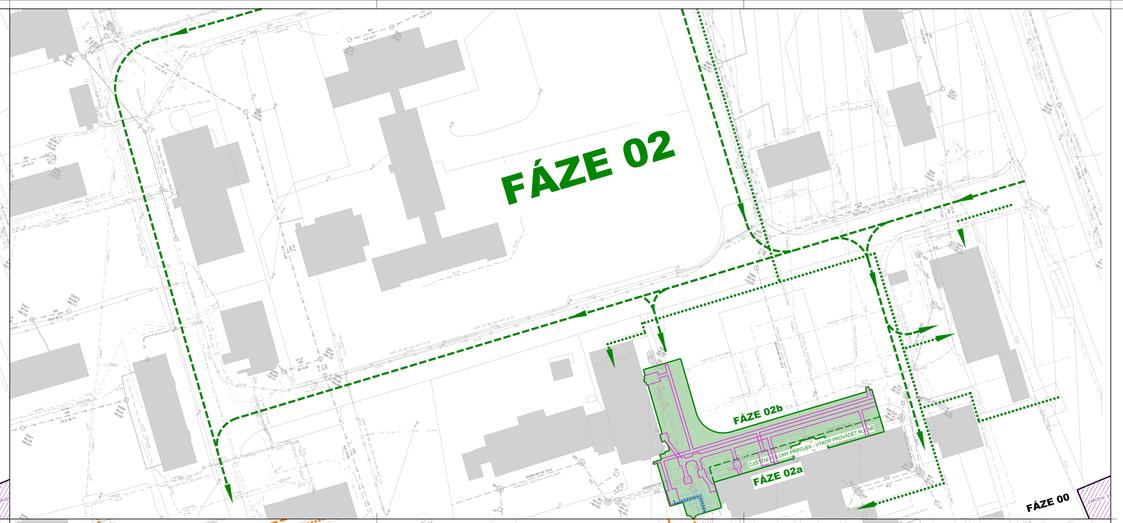

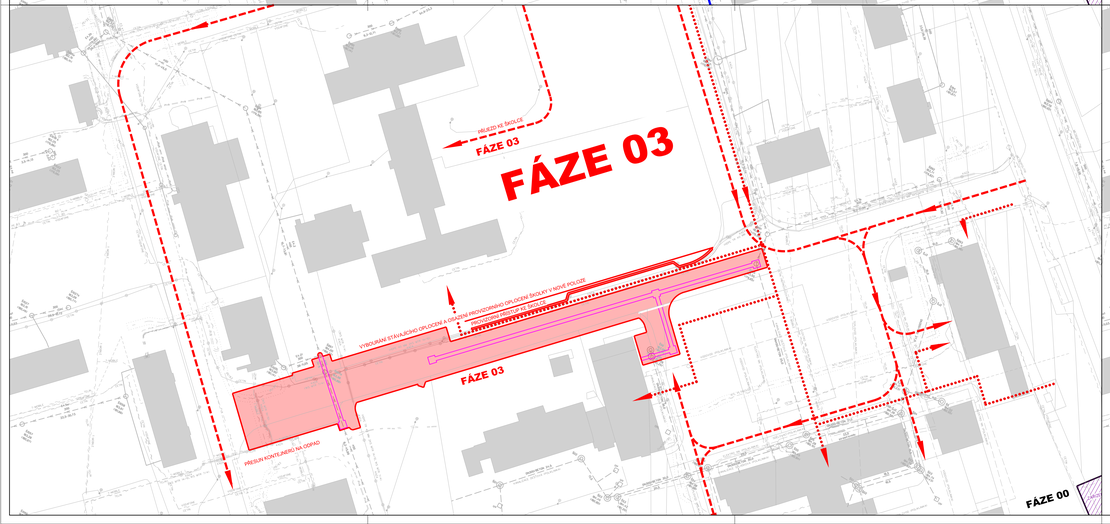

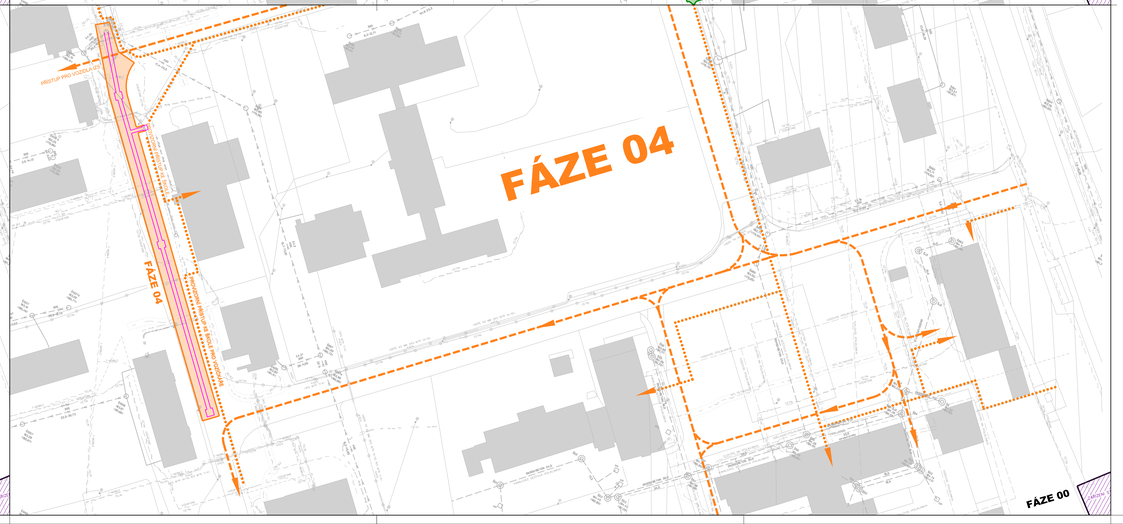

LEGENDA :

HRANICE PARCEL KN

ORGANIZACE DOPRAVY:

FÁZE 01 MOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 02 MOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 03 MOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 04 MOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 01 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 02 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 03 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 04 NEMOTOROVÁ DOPRAVA
FÁZE 01 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
FÁZE 02 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
FÁZE 03 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY
FÁZE 04 STAVENIŠTĚ S VÝKOPY

LEGENDA SÍTÍ:

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
PLYNOVOD
VODOVOD
KANALIZACE
SDĚLOVACÍ KABELY (VODAFONE)
SDĚLOVACÍ KABELY (O2 TEL)
SDĚLOVACÍ KABELY (RADIO)
SDĚLOVACÍ KABELY
TEPLOVOD
NOVÉ SDĚLOVACÍ KABELY METROPOLITNÍ KABEL, KABEL TELIN
NOVÁ ULIČNÍ VPUST PŘIPOJKA
STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST VODY DEŠŤ A MRÍŽ

MUDr. Hana Albrechtová

Digitálně podepsal MUDr. Hana Albrechtová
Datum: 2025.07.14 14:09:12 +02'00'

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

FÁZE 00 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
KÁZOVÉ VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

FÁZE 01 KANALIZACE A VODOVOD
LOKALITA U ZACHRANKY (ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA VJEZD DO ZÓNY POVOLEN POUZE VOZIDLŮM IZS)
ZÁSOBOVÁNÍ PRODEJNY ZÁSILKOVÝCH SLUŽEB (ZÁSILKY BUDOU DORUČOVÁNY DÁLE ZVÝŠENÉ OPATŘENÍ?)

FÁZE 02 KANALIZACE A VODOVOD, POLOHA PŘÍPOJEK DO POLIKLINIKY
LOKALITA POLIKLINIKA (ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA)
(POLOHA PŘÍPOJEK - KOPAT RUČNĚ)

FÁZE 03 KANALIZACE A VODOVOD
LOKALITA MATEŘSKÁ ŠKOLKA, ZMATEŘSKÁ ŠKOLKA (ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA)
(ZACHOVÁNÍ PROVOZU DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY)

FÁZE 04 KANALIZACE A VODOVOD, POLOHA PŘÍPOJEK PRATEKÁ ŠKOLA
LOKALITA KOLLÁROVA (ORGANIZACE DOPRAVY VIZ SCHÉMA, ZACHOVÁNÍ PROVOZU DO ŠKOLY)

FÁZE 05 NOVÉ KABELOVÉ SÍTĚ, DOPRAVA STAVEBNÍCH
PO PŘEPOJENÍ BUDENÍ INFRASTRUKTURY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ZACHOVÁNÍ PROVOZU NEZBYTNÉ DOPRAVNÍ OBSLUHY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

FÁZE 06 TĚLESO MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ÚDRŽBA A VČETNĚ ZHOTOVENÍ
ZACHOVÁNÍ PROVOZU NEZBYTNÉ DOPRAVNÍ OBSLUHY PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

FÁZE 07 PARKOVIŠTĚ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ
VEGETAČNÍ ÚPRAVY

FÁZE 08 DOKONČOVACÍ PRÁCE, VEGETAČNÍ ÚPRAVY

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V RÁMCI ETAPIZACE
A SOUČASNÉ POŽADUJEME PO VYBRANÉMU ZHOTOVITELI STAVBY ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU
PRO VOZIDLA IZS DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ PO CELOU DOBU STAVBY V REŽIMU 24/7

KONTAKT NA DOPRAVOJENSKÉHO PRACOVNÍKA ZZS JMK:
ING. MICHAL BARAN
TEL.: +420 545 113 132
+420 724 117 846
EMAIL: baran.michal@zzsjmk.cz

Softwarový systém JTSK
Výškový systém Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	ADOS
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. ADOLF JEBAVÝ OBOROVÝ PROJEKTANT ČKAIT 0008 386, ČKAIT 00 38 0m email: jebavy@ados.cz tel.: +420 604 718 784

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. ADOLF JEBAVÝ	ING. EVA POKORNÁ

AlternativníOpravnaStudio
ING. EVA POKORNÁ, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR
V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY
V OBORU DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VEMACH ZNAČ. A VEDLAVEC OLOMOUC

OBJEDNATEL	MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ

ULIČNÍ PROSTOR
KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY
SITUAČNÍ VÝKRESY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DATUM	12/2024
FORMÁT	14-A4
ÚČEL	DUSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	21-027
MĚŘÍTKO	M 1:250
ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU C.4
